



# Plano de Recuperação e Resiliência

Ponto de situação

25 de março de 2024


# Ponto de situação

## Pedidos de Pagamento | Desembolsos



Transferências da União Europeia

Pré-Financiamento: 2,2 M€ (pago a 5 agosto 2021)  
 Pré-Financiamento REPowerEU: 0,2 M€ (pago a 21 dezembro 2023)  
 1º Pedido de Pagamento: 1,2 M€ (pago a 9 maio 2022)  
 2º Pedido de Pagamento: 1,8 M€ (pago a 8 de fevereiro 2023)  
 3º Pedido de Pagamento: 1,5 M€ (pago a 28 de dezembro 2023)  
 4º Pedido de Pagamento: 1,0 M€ (pago a 28 de dezembro 2023)  
**Total Recebido: 7,8 M€ (38%) (suspensão 0,7 M€ líquido)**

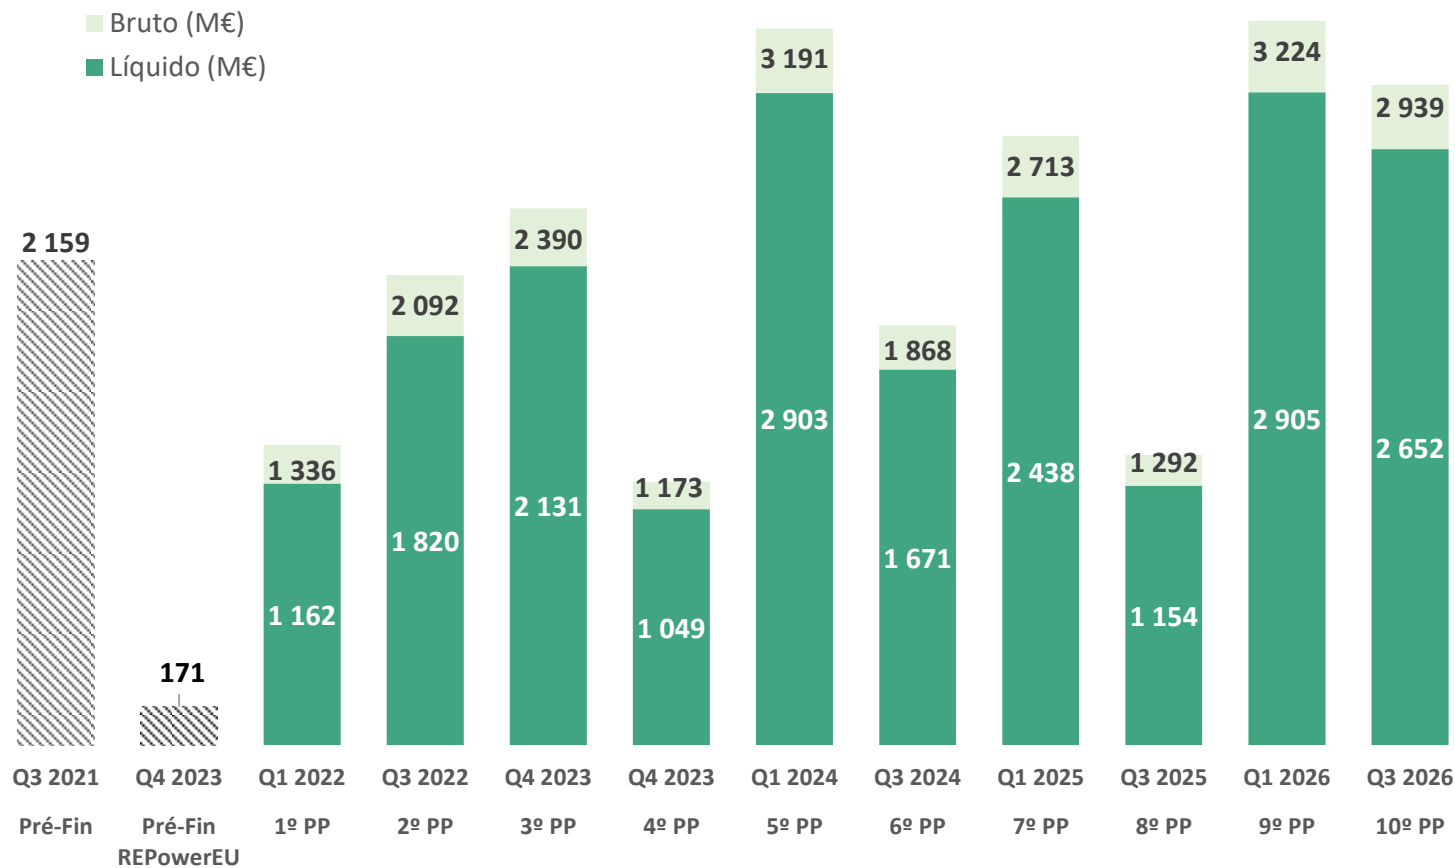

# Ponto de situação

## Visão Global da Execução do PRR



### Dotação do PRR

Contratada com a Comissão Europeia

22.216 M €

% Dotação  
€ / 🌱

% Contratado  
€ / 👤

% Aprovado  
€ / 📄



### Contratação com a Recupera Portugal

Entre a Estrutura de Missão "Recupera Portugal" e as entidades responsáveis pelos investimentos do PRR, os Beneficiários Diretos e Intermediários.



22.084 M €



### Aprovações dos Projetos

Projetos de Beneficiários Diretos ou Beneficiários Finais selecionados.




17.422 M €












### Pagamentos a Beneficiários

Pagamentos aos Beneficiários Diretos ou Beneficiários Finais selecionados.

4.073 M €



# Ponto de situação

	Contratação Pública	Avisos			Beneficiários Diretos e Finais		
	Concursos Lançados <sup>2</sup>	Dotação Avisos	Candidaturas Submetidas	Candidaturas Analisadas	Candidaturas Aprovadas	Aprovado	Pago
 <b>Famílias</b>	n.a.	1.703 M €	243.081	149.969	118.173	203 M €	162 M €
 <b>Instituições da Economia Solidária e Social</b>	n.a.	1.129 M €	7.125	6.003	4.240	426 M €	89 M €
 <b>Empresas</b> Empresas (excepto ENESII em Consórcios) ENESII <sup>3</sup> em Consórcios com Empresas	n.a.	5.177 M €	53.612	44.565	36.647	5.750 M € 4.616 M € 1.134 M €	1.492 M € 1.211 M € 281 M €
 <b>Instit. do Sistema Científico e Tecnológico</b>	n.a.	467 M €	455	425	233	331 M €	81 M €
 <b>Instituições de Ensino Superior</b>	n.a.	608 M €	574	444	260	661 M €	173 M €
 <b>Escolas</b>	258 M €	850 M €	1.737	1.236	878	386 M €	274 M €
 <b>Autarquias e Áreas Metropolitanas</b>	1 M €	1.583 M €	4.012	2.875	2.381	2.095 M €	352 M €
 <b>Entidades Públicas</b>	1.029 M €	2.479 M €	1.782	1.545	1.407	4.825 M €	995 M €
 <b>Empresas Públicas</b>	1.294 M €	1.185 M €	258	205	206	2.744 M €	455 M €
	<b>2.582 M €</b>	<b>15.181 M €</b>	<b>312.636</b>	<b>207.267</b>	<b>164.425</b>	<b>17.422 M €</b>	<b>4.073 M €</b>

1. Dotação sujeita a alterações no âmbito da contratação em curso entre a Recuperar Portugal e os Beneficiários Intermediários e Diretos.

2. Procedimentos de Contratação Pública lançados por Beneficiários Diretos.

3. ENESII: Entidades Não Empresariais do Sistema de Investigação e Inovação.

*Nota:* Análises desenvolvidas com base na informação partilhada entre BI e EMRP


*Fonte:* Relatório Monitorização EMRP – 20.03.2024

## 5.º Pedido de Pagamento


42

marcos e metas

### Tipo

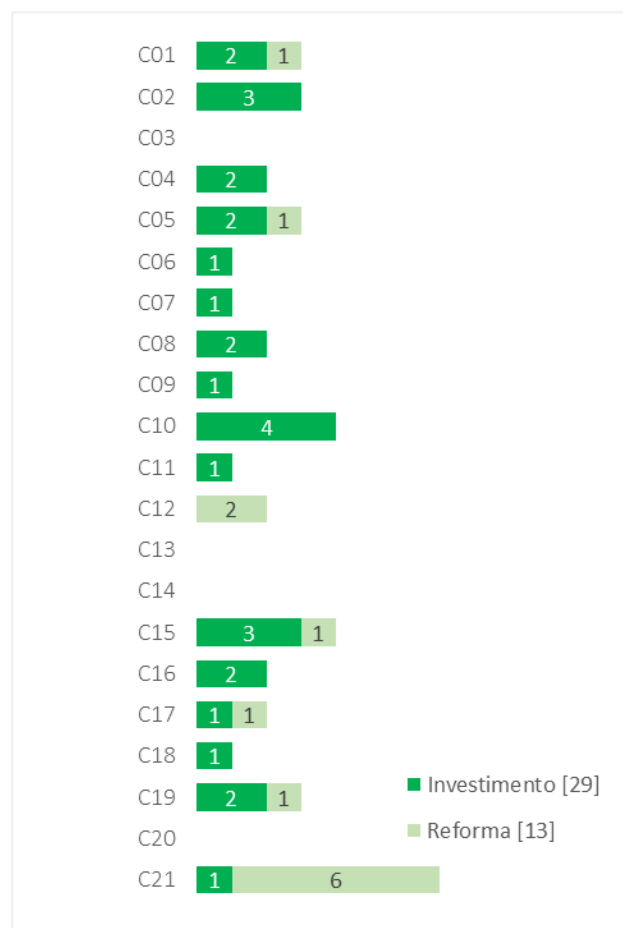

### Estado

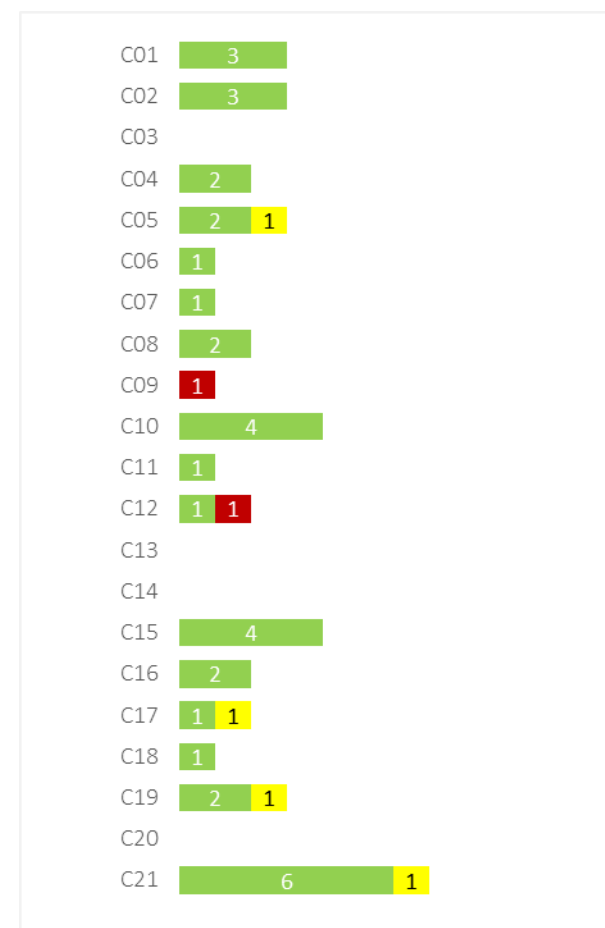

Legenda:

- Em Conclusão
- Em decisão política
- Aguarda desenvolvimentos

**1**

# Marcos e Metas

## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
1.2	C01-r01	T	Reforma dos cuidados de saúde primários	Disponibilização de acesso ao instrumento de estratificação do risco para apoiar a governação clínica nas unidades funcionais dos agrupamentos de centros de saúde	-	N.º	0	1 000	T4 2023	Em Setembro foi formalizada a aquisição de um instrumento de estratificação da população pelo risco. O acesso deste instrumento foi entretanto disponibilizado a todas as unidades de saúde.
1.40	C01-i04	M	Construção do Hospital Lisboa Oriental	Assinatura do contrato de gestão para a construção do Hospital Lisboa Oriental	ACSS, I.P.	-	-	-	T3 2023	Contrato assinado em 02/02/2024. Envio de Cover Note pela EMRP para a COM no dia 12/03
1.41	C01-i10	M	Programa de Modernização Tecnológica do SNS	Aprovação do documento de Levantamento das necessidades de aquisição de novos equipamentos e de substituição dos Equipamentos Médicos Pesados (EMP) existentes e em funcionamento das entidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e da substituição de EMP neles identificados	ACSS, I.P.	-	-	-	T3 2023	Documento aprovado em 31/12/2023. Cover Note e relatório enviados para a COM

## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
2.2	C02-i01	T	Programa de apoio ao acesso à habitação	Programa de apoio ao acesso à habitação – As habitações adquiridas, construídas (eficiência energética elevada) ou reabilitadas (com melhor desempenho energético) são disponibilizadas a famílias	IHRU, I. P.	N.º	0	1 500	T3 2023	1 533 habitações entregues e com evidência. Em fase de envio das evidências para demonstrar cumprimento da medida.
2.6	C02-i02	T	Bolsa nacional de alojamento urgente e temporário	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário – Habitações com obras de construção iniciadas para alojamentos de emergência e de transição (a serem construídas de acordo com a norma de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético) que se encontram em construção	IHRU, I. P.	N.º	0	350	T3 2023	Info a 24/01: das 350 habitações faltam 52; em avaliação: caso a COM aceite para o cumprimento da meta “aquisição + reabilitação” a meta já está cumprida. Em fase de envio das evidências para demonstrar cumprimento da medida
2.16	C02-i04-RAA	T	Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores - renovação	DRPFE	N.º	40	101	T4 2023	38 habitações concluídas até dezembro de 2023 e as restantes em março de 2024. Possível demonstrar o cumprimento de, pelo menos, 95% da meta.



## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
4.9	C04-i01	M	Redes Culturais e Transição Digital	Redes Culturais e Transição Digital - Arquivo Digital dos Órgãos de Comunicação Social	GEPAC	-	-	-	T3 2023	<p>O ANIM já concluiu o processos de aquisição de equipamentos, tendo disponibilizado ao GEPAC a lista. Essa lista está em fase de validação quer pelo GEPAC, quer pela EMRP.</p> <p>Em fase de envio das evidências para demonstrar cumprimento da medida</p>
4.7	C04-i02	T	Património Cultural	Assinatura de contratos para a requalificação e conservação de edifícios que são património cultural e de teatros nacionais	FSPC	N.º	0	49	T3 2023	Concluído.

## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
5.26	C05-r13	M	Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não-financeiras	Desenvolvimento do mercado de capitais — entrada em vigor de legislação	-	-	-	-	T4 2023	<p>Apresentada no CM de 25-mar a legislação relativa à criação de incentivos fiscais.</p> <p>Trata-se de uma proposta de lei, pelo que terá de ser aprovada na AR durante a próxima legislatura.</p> <p><b>Data Prevista Conclusão:</b> a partir de abril 2024</p>
5.43	C05-i06	T	Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de Fomento	Entrega de 650 000 000 EUR a empresas não financeiras portuguesas em capital próprio e quase-capital próprio, em consonância com a política de investimento	BPF	EUR	0	650 M€	T4 2023	<p>À data de 12/03/2023 foi atingido o valor total de 886 M€, que resulta de pagamentos de Investimentos Diretos no montante de 78 M€ e contratos de Investimentos Indiretos no montante de 808 M€, pelo que a meta de 650 M€ foi ultrapassada em 236 M€, estando cumprida.</p>
5.46	C05-i12	T	Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial	Celebração de contratos para desenvolvimento de novos bens e serviços em áreas estratégicas relevantes para a economia hipocarbónica, a resiliência e a adaptação às alterações climáticas.	IAPMEI	N.º	10	20	T3 2023	<p>Foram validados 10 Termos de Aceitação, tendo o IAPMEI considerado para este efeito 10 Agendas Verdes após articulação com a EMRP (ainda que se tenha levantado a hipótese de alteração posterior das Agendas afetadas).</p> <p>Em validação pela COM.</p>

### Atos jurídicos por aprovar

(5.26) Proposta de lei com vista ao desenvolvimento do mercado de capitais com enfoque na criação de incentivos, nomeadamente, i) ao acesso a capitais próprios através do mercado de capitais, ii) à criação de um ambiente propício ao crescimento das empresas, iii) ao financiamento de dívidas no mercado e iv) à participação de investidores

## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
6.3	C06-i01	T	Modernização das instituições de ensino e formação profissionais	Postos de formação beneficiados	IEFP	N.º	0	11 500	T4 2023	A AG confirma que já se encontravam equipados em dezembro de 2023, 11.600 postos de formação.

## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
7.14	C07-i05- RAA	M	Ligações em falta e aumento de capacidade da rede	Estradas construídas ou reabilitadas. Meta cumprida com assinatura dos contratos.	DRPFE	-	-	-	T4 2023	8 contratos foram assinados a 31.12.2023

## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
8.5	C08-i02	T	Cadastro da propriedade rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo	Formação sobre o BUPi	SGMJ	N.º	0	10	T4 2023	Das 10 ações de formação a cumprir foram realizadas 12 ações “BUPI Envolve, das quais, 2 ações em 2021, 5 ações em 2022 e 5 ações em 2023, abrangendo 4.301 formandos, o que permitiu superar a meta prevista.
8.12	C08-i04	T	Meios de prevenção e combate a incêndios rurais	Instalação de dois radares de dupla polarização, com sistema de computação e arquivo, dois detetores de trovoadas e duas estações meteorológicas automáticas.	IPMA, I.P.	N.º	0	2	T4 2023	<p><u>Dois Radares de Dupla Polarização</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Em 10/01/2024 foram inaugurados os dois novos radares meteorológicos da rede explorada pela IPMA em Coruche (Cruz do Leão) e Loulé (Cavalos do Caldeirão).</li> <li>Auto de aceitação provisório assinado em 18/12/2023.</li> </ul> <p><u>Dois Estações Meteorológicas Automáticas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instaladas em 25/10/2023 e auto de aceitação provisório assinado em 30/10/2023.</li> </ul> <p><u>Dois Detetores de trovoadas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instalados e em funcionamento em Olhão (16-17/11/2023) e em Viana do Castelo (23-23/11/2023)</li> <li>Auto de aceitação provisório assinado em 15/12/2023.</li> </ul> <p><u>Servidor de processamento de dados/raio (TLP)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instalado entre 4-7/11/2023, já em pleno funcionamento.</li> <li>Auto de aceitação provisório assinado em 15/12/2023.</li> </ul>

## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
9.10	C09-i04	M	Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato	Subordinada a uma Avaliação de Impacto Ambiental positiva e plenamente conforme aos critérios legais, adoção de uma conceção atualizada da barragem, da geração hídrica e solar de energia elétrica e do sistema de irrigação, tendo plenamente em conta qualquer resultado e condição da AIA	CIMAA	-	-	-	T4 2023	<p><b>Componente Infraestruturas Primária:</b> O concurso público para a empreitada da barragem lançado 08/2023; O prazo para apresentação de pedidos de esclarecimentos era 10 de setembro. No entanto, devido ao número e pertinência dos pedidos recebidos, e após análise ao procedimento e parecer do gabinete Abreu Advogados, a CIMAA deparou-se com a necessidade prorrogar o prazo de apresentação das propostas. Esta prorrogação implica <b>a abertura de propostas em maio de 2024, adiando a sua análise, visto do Tribunal de Contas e Auto de Consignação da obra, para o 2º semestre de 2024.</b></p> <p><b>Componente Infraestruturas Secundárias:</b> <b>O lançamento da empreitada para a rede de rega terá lugar no 2T2024.</b> Estão a ser feitos reajustamentos ao projeto de execução das infraestruturas secundárias, em estreita articulação com a DGADR, ICNF e APA, no sentido de garantir o cumprimento do DNSH e posterior submissão do Relatório de Conformidade Ambiental (RECAPE).</p> <p><b>Componente Central Fotovoltaica:</b> O projeto de execução da central fotovoltaica está concluído. Aguarda-se autorização da DGEG para terminar projeto de execução da ligação da rede à linha elétrica e posterior submissão do RECAPE. A SEEnC e a REN mostraram-se disponíveis para retomar a possibilidade de ligação da central fotovoltaica do Pisão à rede elétrica a uma distância de 6 km.</p> <p><b>Componente Fornecimento de Água à Estação de Tratamento de Águas de Póvoa e Meadas:</b> É necessário elaborar um plano com medidas compensatórias das alterações do habitat da espécie Rato-de-Cabrera (<i>Microtus cabrerae</i>).</p> <p><b>Componente Reinstalação da Aldeia do Pisão:</b> Está a decorrer o processo de suspensão do PDM bem como os processos de expropriação dos terrenos e da aldeia do Pisão. Está também em preparação o concurso para elaboração do Plano de Pormenor e Projeto de Execução da Nova Aldeia do Pisão.</p> <p><b>Data Prevista Conclusão:</b> a partir de julho 2024</p>

## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
10.5	C10-i03	M	Centro de operações de defesa do Atlântico e plataforma naval	Assinatura do contrato relativo à «Plataforma Naval de Natureza Multifuncional» e ao Centro de Operações	Marinha/ Autoridade Marítima Nacional	-	-	-	T3 2023	<p>Plataforma Naval Multifuncional: após a assinatura do contrato para a construção do navio NRP “D. João II” (nome designado para a Plataforma Naval Multifuncional), a 24 de novembro de 2023, foi obtido o visto do Tribunal de Contas no dia 05 de janeiro de 2024. O contrato, entrou em vigor a 12 de janeiro de 2024.</p> <p>No que se refere ao Centro de Operações, O investimento é constituído por um número significativo de intervenções, estando em curso a grande maioria dos procedimentos concursais já lançados ao mercado.</p>
10.6	C10-i03	M	Centro de operações de defesa do Atlântico e plataforma naval	Finalização da Academia do Arsenal do Alfeite	AASA	-	-	-	T4 2023	<p>Academia inaugurada a 27-jun-2023. A requalificação das infraestruturas foi finalizada e estão em fase de conclusão os procedimentos de aquisição de equipamentos tecnológicos, indo ser lançado em dez-2023 um último procedimento concursal para lotes que em concursos anteriores ficaram sem propostas.</p> <p>O processo de certificação da Academia, enquanto entidade formadora pela DGERT, foi concluído com sucesso em janeiro de 2024, nas três áreas de educação e formação propostas.</p>
10.8	C10-i04- RAA	M	Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"	Início do contrato de obras públicas relativo ao centro técnico MARTEC	DRPFE	-	-	-	T4 2023	<p>Contrato de Empreitada foi assinado a 17.10.2023 e visto prévio do Tribunal de Contas obtido em 21.11.2023. Auto de Consignação, assinado em 13.12.2023, dando-se assim formalmente início à obra.</p>
10.17	C10-i07	M	Green Shipping	Lançamento do concurso das intervenções de descarbonização dos navios apoiados	IAPMEI	-	-	-	T3 2023	<p>Lançamento do aviso efetuado no dia 31/01/2024.</p>

## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
11.2	C11-i01	M	Descarbonização da indústria	<p>Assinatura de contratos que atribuem apoio financeiro.</p> <p>Pelo menos 383 milhões de EUR atribuídos a projetos de descarbonização industrial.</p>	IAPMEI	-	-	-	T4 2023	<p>À data de 12/03/2023 encontram-se contratualizados 567M€ o que excede a Meta 11.2 (de 383m€).</p> <p>Porém, para ser cumprida uma meta A do novo inv. C21-i01, em 2026, vão ser realocados projetos da C11 para a C21.</p> <p>Para que as metas A de ambos os investimentos serem cumpridas, é necessária a contratualização de todos os projetos aprovados nos três avisos da C11, o que já está em curso..</p>



## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
12.7	C12-r39	M	Promover a economia circular e mais eficiência na Gestão de Resíduos	Definição harmonizada dos critérios de ecomodulação	-	-	-	-	T4 2023	Assinada a portaria dos critérios de ecomodulação a 22-mar. Aguarda-se publicação em DR.
12.8	C12-r39	M	Promover a economia circular e mais eficiência na Gestão de Resíduos	Entrada em funcionamento do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR)	-	-	-	-	T4 2023	Após publicação em DR do diploma UNILEX, promulgado pelo PR no dia 11-mar-2024, a APA identifica um prazo mínimo de 3 meses para concluir o procedimento de atribuição da licença. <b>Data Prevista Conclusão:</b> a partir de julho 2024

## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
15.1	C15-i01	M	Expansão da rede de metro de Lisboa — linha vermelha até Alcântara	Assinatura do contrato para a expansão da rede de metro de Lisboa	ML, E.P.E.	-	-	-	T4 2023	Contrato assinado. Enviado para o Tribunal de Contas.
15.4	C15-i02	M	Expansão da rede de metro do Porto — Casa da Música-Santo Ovídio	Assinatura do contrato para a expansão da rede de metro do Porto	MP	-	-	-	T4 2023	Contrato assinado. Empreitada consignada 9/jan/2024
15.13	C15-i05	T	Descarbonização dos transportes públicos	Aquisição de novos autocarros de zero emissões (elétricos ou a hidrogénio) utilizados para transporte público	FA	N.º	0	145	T4 2023	Entregues 216 veículos, 150 licenciados (Fundo Ambiental já tem documentação de 148 veículos e aguarda envio dos restantes 2). Licenciamentos dos restantes veículos em curso.
15.14	C15-r30	T	Reforma do ecossistema de transportes	Contratos assinados para serviços públicos de transporte de passageiros nas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais	-	N.º	0	23	T4 2023	15 contratos assinados, ainda faltam 8 CIM (Região de Coimbra, Viseu Dão Lafões, Beira Baixa, Douro, Terras de Trás-os-Montes, Beiras e Serra da Estrela, Oeste e Lezíria do Tejo). Serão considerados contratos estabelecidos pelos municípios para o cumprimento da meta.

## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
16.14	C16-i03	M	Catalisação da transição digital das empresas	Criação de plataformas para o envio de faturas digitais e certificações de cibersegurança, privacidade, usabilidade e sustentabilidade	IAPMEI	-	-	-	T4 2023	<p>O cumprimento do marco implica a criação/operacionalização de 5 novos serviços. Dos cinco, quatro estão operacionais, estando em falta o Selo de Maturidade Digital .</p> <p>Relativamente a este, o IPQ confirmou que neste momento a certificação Europrivacy está aprovada pelo Comité Europeu para a Proteção de Dados, e que iria analisar e aprovar, quando proposto pela CNPD, o nosso referencial.</p> <p>Esta certificação já se encontra disponível no site do EDPB assim como no site da Comissão Europeia, como a primeira certificação europeia aprovada para esta área</p> <p>Esta solução encontra-se em curso e será de rápida implementação. Adicionalmente, o processo da norma nacional irá prosseguir em simultâneo.</p>
16.16	C16-i04	T	Indústria 4.0	Seleção de projetos de investimento em tecnologias i4.0	IAPMEI	N.º	0	200	T4 2023	<p>Foram apresentadas 1 660 candidaturas. Cerca de 382 candidaturas têm assegurado o enquadramento orçamental. Em 8 de março de 2024, foram efetuadas a notificações aos candidatos com base na verificação do valor dos auxílios de minimis pelo limite de 200 mil EUR, na exata medida que a plataforma do registo dos auxílios de minimis, da responsabilidade da AD&amp;C ainda não refletia o novo valor máximo de incentivo de 300 mil EUR.</p>

## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
17.21	C17-i02	M	Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública	Completar a implementação de alguns serviços de pré-preenchimento na declaração relativa ao imposto do Selo	AT	-	-	-	T4 2023	<p>No âmbito da validação do descrito no Acordo Operacional, decorrem discussões sobre o possível ajuste do Mecanismo de Verificação, dado que atualmente solicita-se o relatório de implementação para todas as transações de imóveis e transferência de veículos, quando o solicitado seria aplicá-lo apenas a transmissões gratuitas de bens relativas a sucessões por morte.</p> <p>Dessa forma, o executado até ao momento incide apenas sobre as transmissões, pelo que se considera esta meta como não concluída</p> <p><b>Data Prevista Conclusão:</b> a partir de abril 2024</p>
17.23	C17-r40	M	Eficiência e Simplificação do Sistema de Benefícios Fiscais	Aprovação do diploma que cria a U-TAX	-	-	-	-	T4 2023	<p>Diploma aprovado no CM de 7 de dezembro.</p> <p>Encontra-se em fase de análise por parte da COM que apresentou questões sobre o diploma.</p>

## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
18.5	C18-i01	M	Justiça económica e ambiente empresarial	Sistema informático modernizado para a investigação criminal	PJ	-	-	-	T4 2023	Os desenvolvimentos necessários ao cumprimento da meta de desembolso foram concluídos em dezembro de 2023 e a plataforma está em produção.

**1**

# Marcos e Metas

## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
19.19	C19-i07	T	Administração pública capacitada para a criação de valor público	Programa de estágios para licenciados	DGAEP	N.º	0	1 500	T4 2023	AG reportou existirem, nesta altura, 1501 contratos de estágio alcançando a meta definida.
19.20	C19-i07	T	Administração pública capacitada para a criação de valor público	Trabalhadores dos serviços públicos em teletrabalho	DGAEP	%	0	25	T4 2023	Os resultados mais recentes da DGAEP (inquérito realizado em 3T-2022) indicam que se encontravam em teletrabalho 28,25% dos trabalhadores com funções compatíveis com essa modalidade de trabalho. DGAEP já foi informada das evidências que serão necessárias apresentar para assegurar que a COM considere a meta “satisfatoriamente cumprida”.
19.23	C19-r35	M	Reforma funcional e orgânica da administração pública	Entrada em vigor do pacote legislativo relativo à reorganização da administração pública	-	-	-	-	T4 2023	O XXIII Governo pretende concluir a preparação do pacote legislativo para o novo modelo de organização da Administração Pública, onde se incluem os 2 diplomas apresentados no CM de 25 março. <b>Data Prevista Conclusão:</b> a partir de abril 2024

### Atos jurídicos por concretizar

(19.23) Aprovar o pacote legislativo que reorganiza/revê o modelo de funcionamento do Estado e da administração pública incluindo: (1) a centralização de serviços comuns e partilhados, (2) o combate à dispersão e redundância nos serviços da administração central, (3) a especialização adequada por domínios das entidades da administração pública direta e indireta setoriais, (4) a especialização no âmbito de funções críticas de apoio à atividade governativa e a concentração dos gabinetes do governo num único espaço físico, (5) bem como a promoção de auditoria e avaliação comparativa internas, (6) a promoção da eficiência dos processos, (7) a melhoria contínua e a disseminação das melhores práticas de gestão nas entidades da administração pública

## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
21.7	C21-r43	M	Observatório Nacional da Pobreza Energética	Despacho que operacionaliza o ONPE-PT	-	-	-	-	T3 2023	<p>Publicada a RCM relativa à Estratégia de Longo Prazo de Combate à Pobreza Energética, que cria o Observatório Nacional da Pobreza Energética (ONPE-PT).</p> <p>Publicado Despacho n.º 1335/2024 que determina a composição e funcionamento do ONPE-PT.</p>
21.9	C21-r44	M	Desenvolver e implementar um modelo de Espaço Cidadão Energia	Assinatura de protocolo de cooperação	-	-	-	-	T4 2023	<p>Assinados os 4 protocolos dos Espaços Cidadão Energia (pela ADENE). Os protocolos preveem o envolvimento das entidades em causa no exercício design thinking. Este exercício permitirá especificar a governação e estrutura de financiamento dos Espaços Cidadão Energia, conforme indicado na CID.</p> <p> Lançamento do procedimento de consulta prévia para os serviços de design thinking previsto para 25-mar.</p> <p><b>Data Prevista Conclusão:</b> a partir de junho 2024</p>
21.16	C21-r46	M	Quadro regulatório para a gestão do hidrogénio renovável	Publicação do despacho interpretativo sobre o hidrogénio renovável	-	-	-	-	T3 2023	<p>Concluído. A nota interpretativa foi publicada no despacho n.º 30/2023, de 13 de julho de 2023.</p>
21.18	C21-r47	M	Mecanismos para o desenvolvimento do biometano	Lançamento do 1º leilão de compra centralizada de biometano	-	-	-	-	T3 2023	<p>A consulta pública das peças do procedimento foi finalizada no dia 31/07/2023. O processo de notificação à Comissão, que foi iniciado em 11/08/2023, encontra-se concluído e as peças do concurso estão finalizadas (todos os editais serão partilhados com a pasta de transição).</p>
21.20	C21-r48	M	Simplificação do Quadro Jurídico e Regulamentar Aplicável aos Projetos de Energias Renováveis	Entrada em vigor do UMER 2030	-	-	-	-	T3 2023	<p>Criação da EMER (anteriormente designada de UMER) aprovada em RCM de 14 de março 2024</p>
21.21	C21-r48	M	Simplificação do Quadro Jurídico e Regulamentar Aplicável aos Projetos de Energias Renováveis	Entrada em vigor do Regulamento relativo ao licenciamento municipal de projetos de energia renovável e de armazenamento	-	-	-	-	T3 2023	<p>Publicada a Portaria n.º 71-A/2024 que inclui disposições específicas para os projetos de energias e sistemas de armazenamento através de baterias, substituindo a Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril.</p> <p>Partilhada cover note com COM</p>

## 5.º Pedido de Pagamento

CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Benef.	Unidade	Baseline	Meta	Prazo	Ponto de situação
21.24	C21-i06	M	Gases Renováveis (Dotação Adicional)	Lançamento de aviso para a seleção de projetos de produção de gases renováveis a apoiar	FA	-	-	-	T4 2023	A Comissão Europeia validou a possibilidade de utilizar o montante disponível para reforçar a dotação do 2º aviso, que, entretanto, fora desconsiderada. O aviso está elaborado e será lançado brevemente, tendo já sido consultada a CTSI.

### Atos jurídicos por concretizar

(21.7) Publicação de Portaria que defina os critérios de ecomodelação



## 5.º Pedido de Pagamento

Componente	CID	Medida	M / T	Designação	Descrição	Ações necessárias
<b>C05 – Capitalização e Inovação Empresarial</b>	5.26	C05-r13	M	Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não-financeiras	Desenvolvimento do mercado de capitais — entrada em vigor de legislação	Aprovar a proposta de lei e submeter à AR
<b>C09 – Gestão Hídrica</b>	9.10	C09-i04	M	Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato	Subordinada a uma Avaliação de Impacto Ambiental positiva e plenamente conforme aos critérios legais, adoção de uma conceção atualizada da barragem, da geração hídrica e solar de energia elétrica e do sistema de irrigação, tendo plenamente em conta qualquer resultado e condição da AIA	Acompanhar encerramento concurso público para a empreitada da barragem, garantindo o visto do Tribunal de Contas e o Auto de Consignação da obra. Submissão do RECAPE para as componentes infraestruturas secundárias e central fotovoltaica para obtenção do DECAPE. Acompanhar conclusão do processo de suspensão do PDM, dos processos de expropriação dos terrenos, bem como do concurso para a elaboração do Plano de Pormenor e Projeto de Execução da Nova Aldeia do Pisão
<b>C12 – Bioeconomia Sustentável</b>	12.8	C12-r39	M	Promover a economia circular e mais eficiência na Gestão de Resíduos	Entrada em funcionamento do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR)	Concluir procedimento de atribuição de licença para gestão do SDR pela APA
<b>C17 – Qualidade e Sustentabilidade das Finanças Públicas</b>	17.21	C17-i02	M	Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública	Completar a implementação de alguns serviços de pré-preenchimento na declaração relativa ao imposto do Selo	Clarificação se as ações desenvolvidas dão cumprimento ao mecanismo de verificação do PRR
<b>C19 – Administração Pública Mais Eficiente</b>	19.23	C19-r35	M	Reforma funcional e orgânica da administração pública	Entrada em vigor do pacote legislativo relativo à reorganização da administração pública	Concluir aprovação do pacote legislativo para o novo modelo de organização da Administração Pública.
<b>C21 - REPowerEU</b>	21.9	C21-r44	M	Desenvolver e implementar um modelo de Espaço Cidadão Energia	Assinatura de protocolo de cooperação	Concluir o procedimento de consulta prévia para os serviços de design thinking para especificar modelo de governação e estrutura de financiamento novo modelo de Espaço Cidadão Energia
